



Harmonogram Rzeczowy dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie"

Id.	SPP	Nazwa zadania	Cz.t.	Rozp.	Zak.	2023																							
						lip	sie	wrz	paz	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paz	lis	gru						
1	1	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	308 d	wto, 22.09.13	czw, 23.11.30																								
2	1.1	Podpisanie umowy z Inwestorem	0 d	wto, 22.09.13	wto, 22.09.13																								
3	1.2	Przekazanie Placu budowy	1 d	pon, 22.09.19	pon, 22.09.19																								
4	1.3	Przekazanie placu budowy działki nr 393, 39/4, 148/2	1 d	wto, 22.09.27	wto, 22.09.27																								
5	1.4	Roboty Przygotowawcze	20 d	wto, 22.09.20	pon, 22.10.17																								
6	1.4.1	Wytyczenie pasa drogowego	20 d	wto, 22.09.20	pon, 22.10.17																								
7	1.5	Przebudowa DK 1 na odcinku od 0+000 do 1+685 (M1) - ODCINEK 1	247 d	wto, 22.10.18	wto, 23.10.10																								
8	1.5.1	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu obydwu jezdni Al. Wojska Polskiego na odcinku 1	1 d	wto, 22.10.18	wto, 22.10.18																								
9	1.5.2	Przebudowa wodociągów	40 d	wto, 22.10.18	śro, 22.12.14																								
11	1.5.3	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	40 d	śro, 22.10.26	czw, 22.12.22																								
14	1.5.4	Przebudowa kanalizacji deszczowej	90 d	śro, 22.10.19	pon, 23.02.27																								
19	1.5.5	Przebudowa sieci elektroenergetycznych	200 d	śro, 22.10.19	pią, 23.08.04																								
20	1.5.6	Przebudowa oświetlenia drogowego	80 d	czw, 23.06.15	czw, 23.10.05																								
21	1.5.7	Przebudowa sieci teletechnicznych	200 d	śro, 22.10.19	pią, 23.08.04																								
22	1.5.8	Rozbudowa kanału teletechnicznego	80 d	czw, 23.06.15	czw, 23.10.05																								
23	1.5.9	Przejęcie podziemne PP1	145 d	śro, 22.10.19	czw, 23.05.18																								

Projekt: Przebudowa DK 1	Zadanie		Zadanie nieaktywne	Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Podział		Nieaktywny punkt kontrolny	Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny	
	Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne	Tylko z rozpoczęciem		Postęp	
	Podsumowanie		Zadanie ręczne	Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)	
	Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania	Zadania zewnętrzne		krytyczne	




Harmonogram Rzeczowy dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie"

id.	SPP	Nazwa zadania	Cz.t.	Rozp.	Zak.	2023																							
						lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru						
33	1.5.10	Wiadukt drogowy WD1 wraz z murami oporowymi nad Aleją Legionów	226 d	czw, 22.11.03	wto, 23.09.26	[Gantt bar from late Oct to late Dec]																							
61	1.5.11	Przejście podziemne PP2	160 d	śro, 22.10.26	pią, 23.06.16	[Gantt bar from late Oct to mid Aug]																							
71	1.5.12	Wiadukt drogowy WD2 nad boczną koleją	85 d	pon, 23.04.03	czw, 23.08.03	[Gantt bar from mid Apr to mid Aug]																							
76	1.5.13	Budowa ekranów akustycznych	219 d	czw, 22.11.24	czw, 23.10.05	[Gantt bar from late Oct to late Dec]																							
90	1.5.14	Mury oporowe	141 d	wto, 23.03.07	wto, 23.09.26	[Gantt bar from late Mar to late Sep]																							
95	1.5.15	Roboty drogowe	246 d	śro, 22.10.19	wto, 23.10.10	[Gantt bar from late Oct to late Dec]																							
102	1.6	Przebudowa DK 1 na odcinku od 1+685 (M1) do 2+133 (WD3a) - ODCINEK 2	247 d	wto, 22.10.18	wto, 23.10.10	[Gantt bar from late Oct to late Dec]																							
103	1.6.1	Przebudowa wodociągów	80 d	śro, 22.10.19	pon, 23.02.13	[Gantt bar from late Oct to mid Feb]																							
108	1.6.2	Przebudowa gazociągów	80 d	śro, 22.11.02	pią, 23.02.24	[Gantt bar from late Oct to mid Feb]																							
110	1.6.3	Przebudowa kanalizacji deszczowej	80 d	czw, 22.11.17	pią, 23.03.10	[Gantt bar from late Oct to mid Mar]																							
113	1.6.4	Przebudowa sieci elektroenergetycznych	200 d	wto, 22.10.18	czw, 23.08.03	[Gantt bar from late Oct to late Aug]																							
114	1.6.5	Przebudowa oświetlenia drogowego	80 d	pon, 23.05.22	wto, 23.09.12	[Gantt bar from mid May to late Sep]																							
115	1.6.6	Przebudowa sieci teletechnicznych	200 d	wto, 22.10.18	czw, 23.08.03	[Gantt bar from late Oct to late Aug]																							
116	1.6.7	Rozbudowa kanału teletechnicznego	80 d	pon, 23.05.22	wto, 23.09.12	[Gantt bar from mid May to late Sep]																							
117	1.6.8	Most M1 nad rzeką Wartą	236 d	śro, 22.10.19	wto, 23.09.26	[Gantt bar from late Oct to late Dec]																							
152	1.6.9	Kładka K1 nad rzeką Wartą	175 d	pią, 22.11.25	pią, 23.08.04	[Gantt bar from late Oct to late Aug]																							
165	1.6.10	Wiadukt drogowy WD3 nad ul. Krakowską i ul. Rejtana	246 d	śro, 22.10.19	wto, 23.10.10	[Gantt bar from late Oct to late Dec]																							

Projekt: Przebudowa DK 1	Zadanie		Zadanie nieaktywne	Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Podział		Nieaktywny punkt kontrolny	Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny	
	Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne	Tylko z rozpoczęciem		Postęp	
	Podsumowanie		Zadanie ręczne	Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)	
	Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania	Zadania zewnętrzne		krytyczne	



Harmonogram Rzeczowy dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie"

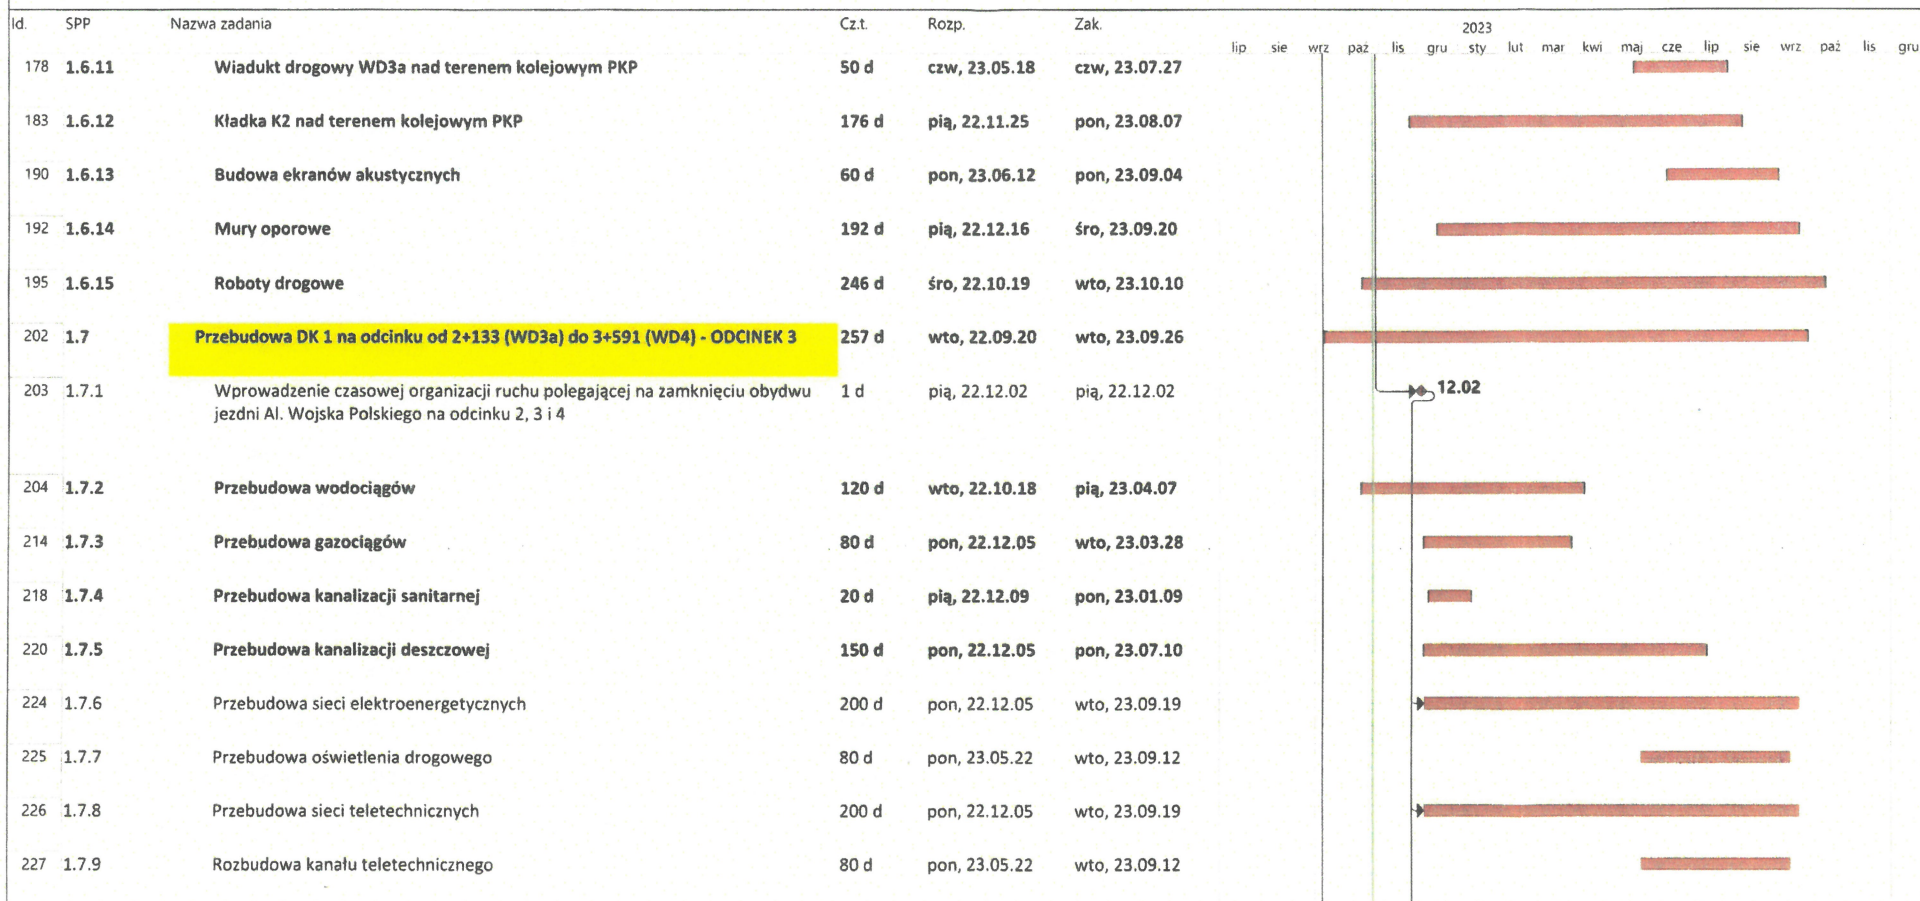

Projekt: Przebudowa DK 1	Zadanie		Zadanie nieaktywne		Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Podział		Nieaktywny punkt kontrolny		Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny	
	Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne		Tylko z rozpoczęciem		Postęp	
	Podsumowanie		Zadanie ręczne		Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)	
	Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania		Zadania zewnętrzne		krytyczne	



Harmonogram Rzeczowy dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie"

Id.	SPP	Nazwa zadania	Czt.	Rozp.	Zak.	2023																	
						lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru
228	1.7.10	Rozbiórka obiektów budowlanych Al. Wojska Polskiego 105 i ul. Równoległa 8	20 d	śro, 22.09.28	wto, 22.10.25																		
229	1.7.11	Rozbiórka stacji benzynowej	30 d	śro, 22.10.26	czw, 22.12.08																		
230	1.7.12	Wiadukt drogowy WD3b nad ul. Bór	179 d	wto, 22.09.20	wto, 23.06.06																		
240	1.7.13	Kładka K3 przy ul. Stromej	207 d	wto, 22.10.18	pon, 23.08.14																		
286	1.7.14	Kładka K4 przy ul. Prostej	216 d	wto, 22.10.18	pon, 23.08.28																		
340	1.7.15	Kładka K4a przy ul. Powstańców śląskich	212 d	czw, 22.11.17	wto, 23.09.19																		
380	1.7.16	Budowa ekranów akustycznych	115 d	czw, 23.04.13	wto, 23.09.26																		
414	1.7.17	Mury oporowe	40 d	czw, 23.04.13	pon, 23.06.12																		
416	1.7.18	Roboty drogowe	208 d	śro, 22.11.30	wto, 23.09.26																		
423	1.8	Przebudowa DK 1 na odcinku od 3+591 (WD4) do 5+488 - ODCINEK 4	247 d	wto, 22.10.18	wto, 23.10.10																		
424	1.8.1	Przebudowa wodociągów	120 d	wto, 22.10.18	pią, 23.04.07																		
430	1.8.2	Przebudowa gazociągów	160 d	wto, 22.10.18	śro, 23.06.07																		
435	1.8.3	Przebudowa sieci ciepłowniczej 2x Dn400/560	162 d	wto, 22.10.18	pon, 23.06.12																		
440	1.8.4	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	20 d	wto, 23.01.10	pon, 23.02.06																		
442	1.8.5	Przebudowa kanalizacji deszczowej	120 d	pon, 22.12.05	pią, 23.05.26																		
447	1.8.6	Przebudowa sieci elektroenergetycznych	200 d	pon, 22.12.05	wto, 23.09.19																		

Projekt: Przebudowa DK 1	Zadanie		Zadanie nieaktywne	Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Podział		Nieaktywny punkt kontrolny	Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny	
	Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne	Tylko z rozpoczęciem		Postęp	
	Podsumowanie		Zadanie ręczne	Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)	
	Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania	Zadania zewnętrzne		krytyczne	



Harmonogram Rzeczowy dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie"

Id.	SPP	Nazwa zadania	Czt.	Rozp.	Zak.	2023																	
						lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru
448	1.8.7	Przebudowa oświetlenia drogowego	80 d	wto, 23.06.20	wto, 23.10.10																		
449	1.8.8	Przebudowa sieci teletechnicznych	200 d	pon, 22.12.05	wto, 23.09.19																		
450	1.8.9	Rozbudowa kanału teletechnicznego	80 d	wto, 23.06.20	wto, 23.10.10																		
451	1.8.10	Wiadukt drogowy WD4 nad Aleją Pokoju wraz z murami oporowymi	225 d	pon, 22.11.21	wto, 23.10.10																		
467	1.8.11	Przejście podziemne PP3	212 d	czw, 22.11.24	wto, 23.09.26																		
492	1.8.12	Kładka K5 przy ul. Okrzei	227 d	czw, 22.11.17	wto, 23.10.10																		
538	1.8.13	Kładka K6 przy ul. Mireckiego	230 d	wto, 22.10.18	pią, 23.09.15																		
571	1.8.14	Wiadukt drogowy WD5 nad ul. Rakowską	50 d	czw, 23.06.01	czw, 23.08.10																		
576	1.8.15	Przebudowa ekranów akustycznych	151 d	śro, 23.02.01	śro, 23.09.06																		
592	1.8.16	Roboty drogowe	215 d	pon, 22.12.05	wto, 23.10.10																		
599	1.9	Docelowa organizacja ruchu	60 d	wto, 23.07.18	wto, 23.10.10																		
600	1.10	Zieleni - nasadzenia	50 d	wto, 23.08.01	wto, 23.10.10																		
601	1.11	Dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	51 cd	wto, 23.10.10	czw, 23.11.30																		

Projekt: Przebudowa DK 1	Zadanie		Zadanie nieaktywne	Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Podział		Nieaktywny punkt kontrolny	Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny	
	Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne	Tylko z rozpoczęciem		Postęp	
	Podsumowanie		Zadanie ręczne	Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)	
	Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania	Zadania zewnętrzne		krytyczne	

